

# Protokoll Dichtheitsprüfung

DVGW TRGI 2008 G600



Elektro - und Lackieranlagen Systemtechnik


**ELSTEC GmbH**

**Platz der Jugend 24  
06774 Muldestausee  
Tel. 034955 40609  
Info@elstec.de**

Kunde SIEMENS  
Strasse  
Ort Chemnitz  
Anlage Kabine Brenner Nr 144145/2  
Strasse  
Ort

Messung am 12.09.2016 10:48  
Prüfer ELSTEC GmbH Czaja

Grund der Messung Dichtheitsprüfung am Gasmultiblock  
des Brenners Kabine  
Messort zwischen MV 1 und MV 2

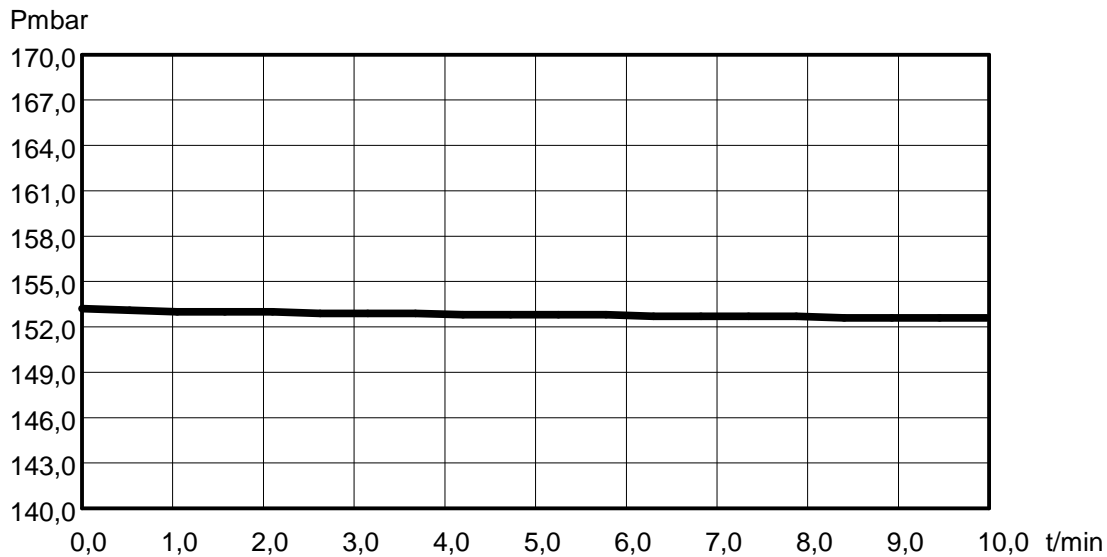

Startdruck	153,2 mbar
Enddruck	152,6 mbar
Druckabfall	0,6 mbar
Messzeit	10,0 min
Stab.zeit	10,0 min

Bemerkungen : ohne Mangel

Datum

Unterschrift

ELSTEC GmbH
